

令和7年度北条道路松神地区舗装工事

工事概要

施 工 者	東亜道路工業株式会社	道路土工1式、舗装工1式／排水性舗装工 13,840m ² 、 排水構造物工1式、縁石工1式、標識工1式、道路付属 施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式	
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町下神地内～松神 地内		
工 期	令和8年4月1日 ～令和9年2月26日	工事進捗率 (令和8年7月末)	4.6% / 5.6%

※実施/計画

コメント

概要 東西に約680mの本線があり、一般道からの乗り入れ区間を含めると約1000mの施工区間がある舗装工事です。7月からは電気・通信管等の施設や雨水等を排水する施設を設置し、9月から舗装工事を開始し路盤を施工します。12月を目標に舗装工事が完了できるように進めてまいります。 8月は排水構造物と防草対策で張コンクリートを施工しています。 9月からは全施工延長のうち約半分の構造物を終え、10月から舗装を開始する予定です。

工事写真



令和8年6月5日【着工前】




令和8年7月27日




令和8年9月11日

令和7年度北条道路松神地区舗装工事

工事写真

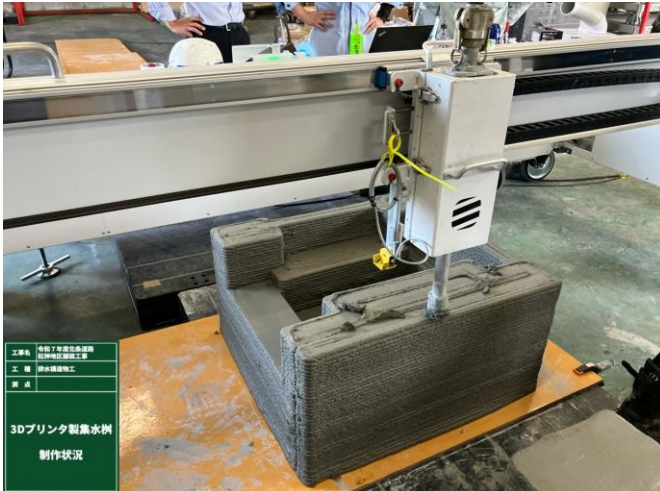

排水構造物工
集水桝・マンホール工
現場打ち街渠桝
製作状況
3Dプリンターを活用

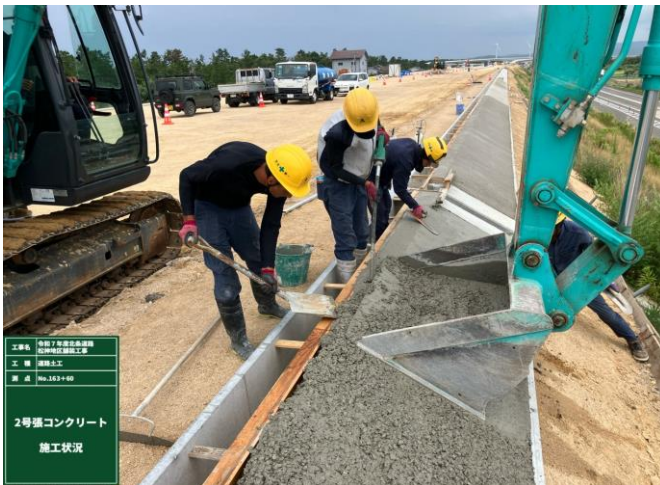

道路付属施設工
道路土工
張コンクリート打設状況



排水構造物工
側溝工
水路設置状況
